Niedersachsen Ports

Bauzeitenplan LNG Anleger 1 WHV Stand 17.06.22

Unterlage 05

Nr.	Vorgangsvorgangsname	ET Dauer	Ist Anfang	Ist Ende	Ressourcennamen	Bemerkung
1	**MEILENSTEINE**	**103 Tage**	**Fre 01.04.22**	**Mi 31.08.22**		
2	Erteilung der Verfahrensmacht für den AG (Mitteilungserteilung)	0 Wochen	Fre 01.04.22	Fre 01.04.22		
3	Erteilung des Vertragsmodells, a.B. Kostenerstattungsvertrag mit Budget	5 Wochen	Fre 01.04.22	Mon 25.04.22		
4	Auftragserteilung	0 Wochen	Mi 04.05.22	Mi 04.05.22		
5	1. Vorläufiger Baubeginn	0 Tage	Fre 29.04.22	Fre 29.04.22		
6	Baubeginn Rohrrammung DN2100	0 Tage	Mi 20.07.22	Mi 20.07.22		
7	Plangenehmigung (Nassbaggern)	0 Tage	Mi 31.08.22	Mi 31.08.22		
8	1. Rammung	0 Tage	Don 05.05.22	Don 05.05.22		
9	**PLANUNG UND BESCHAFFUNG**	**105 Tage**	**Don 28.04.22**	**Do 27.08.22**		
10	Technische Bearbeitung Gründung	2 Wochen	Mon 02.05.22	Fre 13.05.22		
11	Technische Bearbeitung Betonbauteile	5 Wochen	Mon 16.05.22	Mi 08.06.22		
12	Technische Bearbeitung Stahlbau	4 Wochen	Don 09.06.22	Mi 06.07.22		
13	Technische Bearbeitung Ausrüstung	2 Wochen	Mon 16.05.22	Die 31.05.22		
14	**Lieferung Rohrmaterial / Weiterverarbeitung**	**71 Tage**	**Don 28.04.22**	**Do 08.08.22**		
15	Lieferung Tragrohre (Plattform) Ø1220x0,9,5 aus Kleipeda	2 Tage	Don 28.04.22	Fre 29.04.22		
16	Baustellenstöße Tragrohre (Plattform), Navikon	23 Tage	Mi 18.05.22	Mi 22.06.22		
17	Lieferung Tragrohre (Anlegedalben) Ø2216x31,0, Remo (BS Kal)	2,8 Wochen	Mon 16.05.22	Die 07.06.22		
18	Werkstattstöße Tragrohre (Anlegedalben), USM (BHV)	32 Tage	Mon 16.05.22	Fre 01.07.22		
19	Lieferung Tragrohre (Verbaudalben P1, P4 / Anlegedalben) Ø1215x31,0, Arcelor (BS Kal)	0 Wochen	Die 07.06.22	Die 07.06.22		
20	Lieferung Tragrohre (Verbaudalben P1, P4 / Anlegedalben) Ø1215x31,0, Arcelor (BS Kal)	0 Wochen	Mi 22.06.22	Mi 22.06.22		Noch offen
21	Lieferung Tragrohre (Dalbenkern) Ø1207x26,8, Arcelor (BS Kal)	0 Wochen	Mi 29.06.22	Mi 29.06.22		
22	Lieferung Tragrohre (Zugangsbrücke) Ø2100x22,0, Swanenberg (BHV)	4 Wochen	Mon 04.07.22	Fre 29.07.22		
23	Werkstattstöße Tragrohre (Zugangsbrücke / Gangways), USM	2 Tage	Mon 18.07.22	Die 19.07.22		
24	Werkstattstöße Tragrohre (Zugangsbrücke / Gangway), USM	2 Tage	Mon 25.07.22	Die 26.07.22		
25	Werkstattstöße Tragrohre (Zugangsbrücke / Gangway), USM	2 Tage	Mon 01.08.22	Die 02.08.22		
26	Werkstattstöße Tragrohre (Zugangsbrücke / Gangway), USM	2 Tage	Mon 08.08.22	Die 09.08.22		
27	Lieferung Schrägpfähle (Plattform) Ø711x17,5 (BS Kal)	0 Wochen	Mi 29.06.22	Mi 29.06.22		
28	Lieferung Schrägpfähle (Verbaudalben P2, P3) Ø711x16,0 (BS Kal)	0 Wochen	Mi 29.06.22	Mi 29.06.22		
29	Baustellenstöße Schrägpfähle (Plattform), Navikon	6 Tage	Mi 29.06.22	Mon 04.07.22		
30	Baustellenstöße Schrägpfähle (Verbaudalben), Navikon	11 Tage	Die 05.07.22	Don 21.07.22		
31	**Betonbau Fertigteile (BW Bettels in Emden)**	**70 Tage**	**Don 09.06.22**	**Die 27.09.22**		
48	**Stahlbau Gangways (Klaas Siemens)**	**55 Tage**	**Mon 04.07.22**	**Fre 16.09.22**		
47	**Baustelleneinrichtung, Gerätemobilisierung, Gerätevorfügbarkeit**	**54 Tage**	**Mon 25.04.22**	**Die 12.07.22**		
68	Baustelleneinrichtung (Container, Schweißanlage) (BS Kal)	2 Wochen	Mi 04.05.22	Die 17.05.22		
69	Gerätemobilisierung Einheit "KURT"	2 Wochen	Mon 25.04.22	Fre 06.05.22	KURT, HSB5, CK900	
70	Schleusensperrung Seeschleuse Wilhelmshaven	0 Tage	Mi 08.06.22	Mi 08.06.22		
71	Gerätemobilisierung Einheit "KURT"	5 Tage	Fre 03.06.22	Mi 08.06.22	KURT, HSB5, CK900	
72	Geräteeinheit KURT, keine Einbauleistung, Abnahme Schiffsunterzuchungskommission	1 Tag	Fre 17.06.22	Fre 17.06.22		
73	Gerätemobilisierung ANNESIRET, inkl. Beinverlängerungen	14 Tage	Mon 30.05.22	Fre 17.06.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
74	Gerätemobilisierung Hubinsel Andreas	2 Wochen	Mon 27.06.22	Fre 08.07.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
75	Gerätemobilisierung Arbeitsponton JB6189	5 Tage	Mon 25.04.22	Fre 29.04.22	JB6189	
76	Aufbau Schwingmäkler	5 Tage	Mi 06.07.22	Die 12.07.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
77	**Drucksondierungen ("Kurt", HS899, Probebelastungseinheit GTC)**	**17 Tage**	**Mon 09.05.22**	**Don 02.06.22**		
79	**Rammarbeiten**	**79 Tage**	**Don 09.06.22**	**Die 27.09.22**		
80	**Lastfälle**	**70 Tage**	**Don 09.06.22**	**Fre 16.09.22**		
81	Gründungsrohre Plattform, Ø1220x0,9,5	12 Tage	Mon 20.06.22	Die 05.07.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
82	Gründungsrohre, lotrecht, Anlegedalben F1, Ø1216x31,0	10 Tage	Mon 05.06.22	Fre 16.09.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
83	Gründungsrohre, lotrecht, Anlegedalben F2, Ø1216x31,0	6 Tage	Die 28.06.22	Fre 08.07.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
84	Gründungsrohre, lotrecht, Anlegedalben F3, Ø1216x31,0	6 Tage	Don 09.06.22	Don 16.06.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
85	Gründungsrohre, lotrecht, Anlegedalben F3, Ø1216x31,0	5 Tage	Die 21.06.22	Mon 27.06.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
86	Gründungsrohre, lotrecht, Verbaudalben P1, Ø1215x30,9	10 Tage	Fre 05.08.22	Don 18.08.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
87	Gründungsrohre, lotrecht, Verbaudalben P2, Ø1207x26,8	8 Tage	Mon 11.07.22	Mi 21.07.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
88	Gründungsrohre, lotrecht, Verbaudalben P3, Ø1207x26,8	8 Tage	Die 26.07.22	Don 04.08.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
89	Gründungsrohre, lotrecht, Verbaudalben P4, Ø1215x30,9	10 Tage	Fre 19.08.22	Don 01.09.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
90	**Gründungsrohre, lotrecht, Zugangsbrücke, Ø2100x22,0**	**5 Tage**	**Don 21.07.22**	**Mon 25.07.22**	**KURT, HS899, CK900**	**KURT, HS899, CK900**
91	T2-01	0,5 Tage	Don 21.07.22	Don 21.07.22		
92	T2-02	0,5 Tage	Don 21.07.22	Don 21.07.22		
93	T2-03	0,5 Tage	Fre 22.07.22	Fre 22.07.22		
94	T2-04	0,5 Tage	Fre 22.07.22	Fre 22.07.22		
95	T2-05	0,5 Tage	Mon 25.07.22	Mon 25.07.22		
96	T2-06	0,5 Tage	Mon 25.07.22	Mon 25.07.22		
97	**Gründungsrohre, lotrecht, Gangways, Ø2100x22,0, süd**	**10 Tage**	**Die 25.08.22**	**Don 15.09.22**		
98	ZST-02	1 Tag	Die 23.08.22	Die 23.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
99	ZST-03	1 Tag	Mi 24.08.22	Mi 24.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
100	ZST-04	1 Tag	Don 25.08.22	Don 25.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
101	ZST-05	1 Tag	Fre 26.08.22	Fre 26.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
102	ZST-06	1 Tag	Mon 29.08.22	Mon 29.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
103	ZST-07	1 Tag	Mi 31.08.22	Mi 31.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
104	ZST-08	1 Tag	Don 01.09.22	Don 01.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
105	ZST-09	1 Tag	Fre 02.09.22	Fre 02.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
106	ZST-10	1 Tag	Die 13.09.22	Die 13.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
107	ZST-11	1 Tag	Mi 14.09.22	Mi 14.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
108	ZST-12	1 Tag	Don 15.09.22	Don 15.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
109	**Gründungsrohre, lotrecht, Gangways, Ø2100x22,0, nord**	**10 Tage**	**Die 30.08.22**	**Mon 12.09.22**		
110	ZNT-02	1 Tag	Die 30.08.22	Die 30.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
111	ZNT-03	1 Tag	Mon 05.09.22	Mon 05.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
112	ZNT-04	1 Tag	Die 06.09.22	Die 06.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
113	ZNT-05	1 Tag	Mi 07.09.22	Mi 07.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
114	ZNT-06	1 Tag	Don 08.09.22	Don 08.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
115	ZNT-07	1 Tag	Fre 09.09.22	Fre 09.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
116	ZNT-08	1 Tag	Mon 12.09.22	Mon 12.09.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
117	Elsbeweiser ZST-01, ZNT-01, Ø1207x26,8	1 Tag	Fre 02.09.22	Fre 02.09.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
118	Elsbeweiser ZST-01, ZNT-01, Ø1207x26,8	7 Tage	Mon 19.09.22	Die 27.09.22	KURT, HSB5, CK900	KURT, HSB5, CK900
119	**Schrägpfähle**	**56 Tage**	**Mon 11.07.22**	**Mon 26.09.22**		
120	Ausstellung Tragrohre, Vorbereitung Auflager Schrägpfahlrammung, Plattform	1 Woche	Mon 11.07.22	Fre 15.07.22	JB6189	
121	Schrägpfähle Plattform, Ø711x16,0	5 Tage	Mon 18.07.22	Fre 22.07.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
122	Ausstellung Tragrohre, Vorbereitung Auflager Schrägpfahlrammung, Verbaudalben P2	4 Tage	Don 21.07.22	Die 26.07.22	JB6189	
123	Schrägpfähle Verbaudalben P2, Ø711x17,5	8 Tage	Mi 27.07.22	Fre 05.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
124	Ausstellung Tragrohre, Vorbereitung Auflager Schrägpfahlrammung, Verbaudalben P3	4 Tage	Fre 05.08.22	Mi 10.08.22	JB6189	
125	Schrägpfähle Verbaudalben P3, Ø711x17,5	8 Tage	Don 11.08.22	Mon 22.08.22	ANNESIRET, HSB5	ANNESIRET, HSB5
126	Mikropfähle - Plattform, ausläufischer Zeitbedarf Umsetzvorgänge / Einrichtung	4 Tage	Mon 25.07.22	Don 28.07.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
127	Mikropfähle - Plattform	8 Tage	Fre 29.07.22	Die 09.08.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
128	Mikropfähle - Plattform, ausläufischer Zeitbedarf Umsetzvorgänge / Einrichtung	4 Tage	Mi 10.08.22	Mon 15.08.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
129	Mikropfähle - Verbaudalben P2	13 Tage	Die 16.08.22	Don 01.09.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
130	Mikropfähle - Plattform, ausläufischer Zeitbedarf Umsetzvorgänge / Einrichtung	4 Tage	Fre 02.09.22	Mi 07.09.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
131	Mikropfähle - Verbaudalben P3	13 Tage	Don 08.09.22	Mon 26.09.22	Hubinsel Andreas	Hubinsel Andreas
132	**BETONARBEITEN**	**82 Tage**	**Mon 11.07.22**	**Die 05.11.22**		
133	Vorbereitung Rohrkröpfe Zugangsbrücke, Manschetten	1 Woche	Don 28.07.22	Mi 03.08.22	JB6189	
134	Einbau FT Zugangsbrücke	2 Tage	Mon 08.08.22	Die 09.08.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
135	Betonbau / Einbauteile - Zugangsplattform	5 Wochen	Mi 10.08.22	Die 13.09.22		
136	Vorbereitung Rohrkröpfe Plattform, Manschetten	1 Woche	Mon 11.07.22	Fre 15.07.22	JB6189	
137	Einbau FT Plattform	2 Tage	Mi 10.08.22	Don 11.08.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
138	Betonbau / Einbauteile - Plattform	5 Wochen	Fre 12.08.22	Don 15.09.22		
139	Vorbereitung Rohrkröpfe Anlegedalben F1, Manschetten	1 Woche	Mon 19.08.22	Fre 23.09.22	JB6189	
140	Einbau FT- Anlegedalben F1	2 Tage	Mon 26.08.22	Die 27.09.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
141	Betonbau / Einbauteile - Anlegedalben F1	5 Wochen	Mi 28.09.22	Don 05.11.22		
142	Vorbereitung Rohrkröpfe Anlegedalben F2, Manschetten	1 Woche	Don 04.08.22	Mi 10.08.22	JB6189	
143	Einbau FT- Anlegedalben F2	2 Tage	Don 11.08.22	Fre 12.08.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
144	Betonbau / Einbauteile - Anlegedalben F2	5 Wochen	Mon 12.09.22	Mon 17.10.22		
145	Vorbereitung Rohrkröpfe Anlegedalben F3, Manschetten	1 Woche	Don 11.08.22	Mi 17.08.22	JB6189	
146	Einbau FT- Anlegedalben F3	2 Tage	Don 18.08.22	Fre 19.08.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
147	Betonbau / Einbauteile - Anlegedalben F3	5 Wochen	Mon 12.09.22	Mon 17.10.22		
148	Vorbereitung Rohrkröpfe Verbaudalben P1	1 Woche	Fre 16.08.22	Don 25.08.22	JB6189	
149	Einbau FT- Verbaudalben P1	2 Tage	Fre 16.09.22	Die 20.09.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
150	Betonbau / Einbauteile - Verbaudalben P1	5 Wochen	Die 20.09.22	Die 25.10.22		
151	Vorbereitung Rohrkröpfe Verbaudalben P2	1 Woche	Don 21.07.22	Mi 27.07.22	JB6189	
152	Einbau FT- Verbaudalben P2	2 Tage	Die 13.09.22	Don 15.09.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
153	Betonbau / Einbauteile - Verbaudalben P2	5 Wochen	Don 15.09.22	Don 20.10.22		
154	Vorbereitung Rohrkröpfe Verbaudalben P3	1 Woche	Fre 26.08.22	Don 01.09.22	JB6189	
155	Einbau FT- Verbaudalben P3	2 Tage	Die 27.09.22	Mi 28.09.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
156	Betonbau / Einbauteile - Verbaudalben P3	5 Wochen	Mon 26.09.22	Die 01.11.22		
157	Vorbereitung Rohrkröpfe Verbaudalben P4	1 Woche	Fre 02.09.22	Don 08.09.22	JB6189	
158	Einbau FT- Verbaudalben P4	2 Tage	Don 22.09.22	Mon 26.09.22	Schwimmkran Enak	Schwimmkran Enak
159	Betonbau / Einbauteile - Verbaudalben P4	5 Wochen	Mon 26.09.22	Die 01.11.22		
160	**Gangway Montage**	**52 Tage**	**Don 25.08.22**	**Die 08.11.22**		
162	**AUSRÜSTUNGSARBEITEN**	**38 Tage**	**Fre 16.09.22**	**Don 10.11.22**		
163	Ausrüstung	7,6 Wochen	Fre 16.09.22	Don 10.11.22		
164	Slipkeken, Anlegedalben F1	1 Woche	Fre 04.11.22	Don 10.11.22		
165	Slipkeken, Anlegedalben F2	1 Woche	Die 18.10.22	Mon 24.10.22		
166	Slipkeken, Verbaudalben P1	1 Woche	Mi 26.10.22	Mi 02.11.22		
167	Slipkeken, Verbaudalben P2	1 Woche	Fre 21.10.22	Don 27.10.22		
168	Slipkeken, Verbaudalben P3	1 Woche	Mi 02.11.22	Die 08.11.22		
169	Slipkeken, Verbaudalben P4	1 Woche	Mi 02.11.22	Die 08.11.22		
170	**LNEPER (NACHRICHTLICH STAND 09.06.2022)**	**162,5 Tage**	**Fre 06.05.22**	**Don 09.01.23**		
171	Suprastruktur	25 Wochen	Fre 01.07.22	Mi 04.01.23		
172	Floating Storage Regasification Unit (FSRU)	4 Wochen	Fre 25.11.22	Don 22.12.22		
173	Hinterlandanbindung	32,5 Wochen	Fre 06.05.22	Don 05.01.23		
174	**Wasserbauarbeiten**	**120 Tage**	**Die 28.06.22**	**Don 15.12.22**		
175	Nassbaggerarbeiten	12 Wochen	Don 01.09.22	Mon 28.11.22		
176	Monitoring Kolkschutz	12 Wochen	Die 28.06.22	Mon 19.09.22		
177	Kolkschutzmaßbahnen	12 Wochen	Die 20.09.22	Don 15.12.22		
178	**Inbetriebnahme**	**1 Tag**	**Mon 02.01.23**	**Mon 02.01.23**		

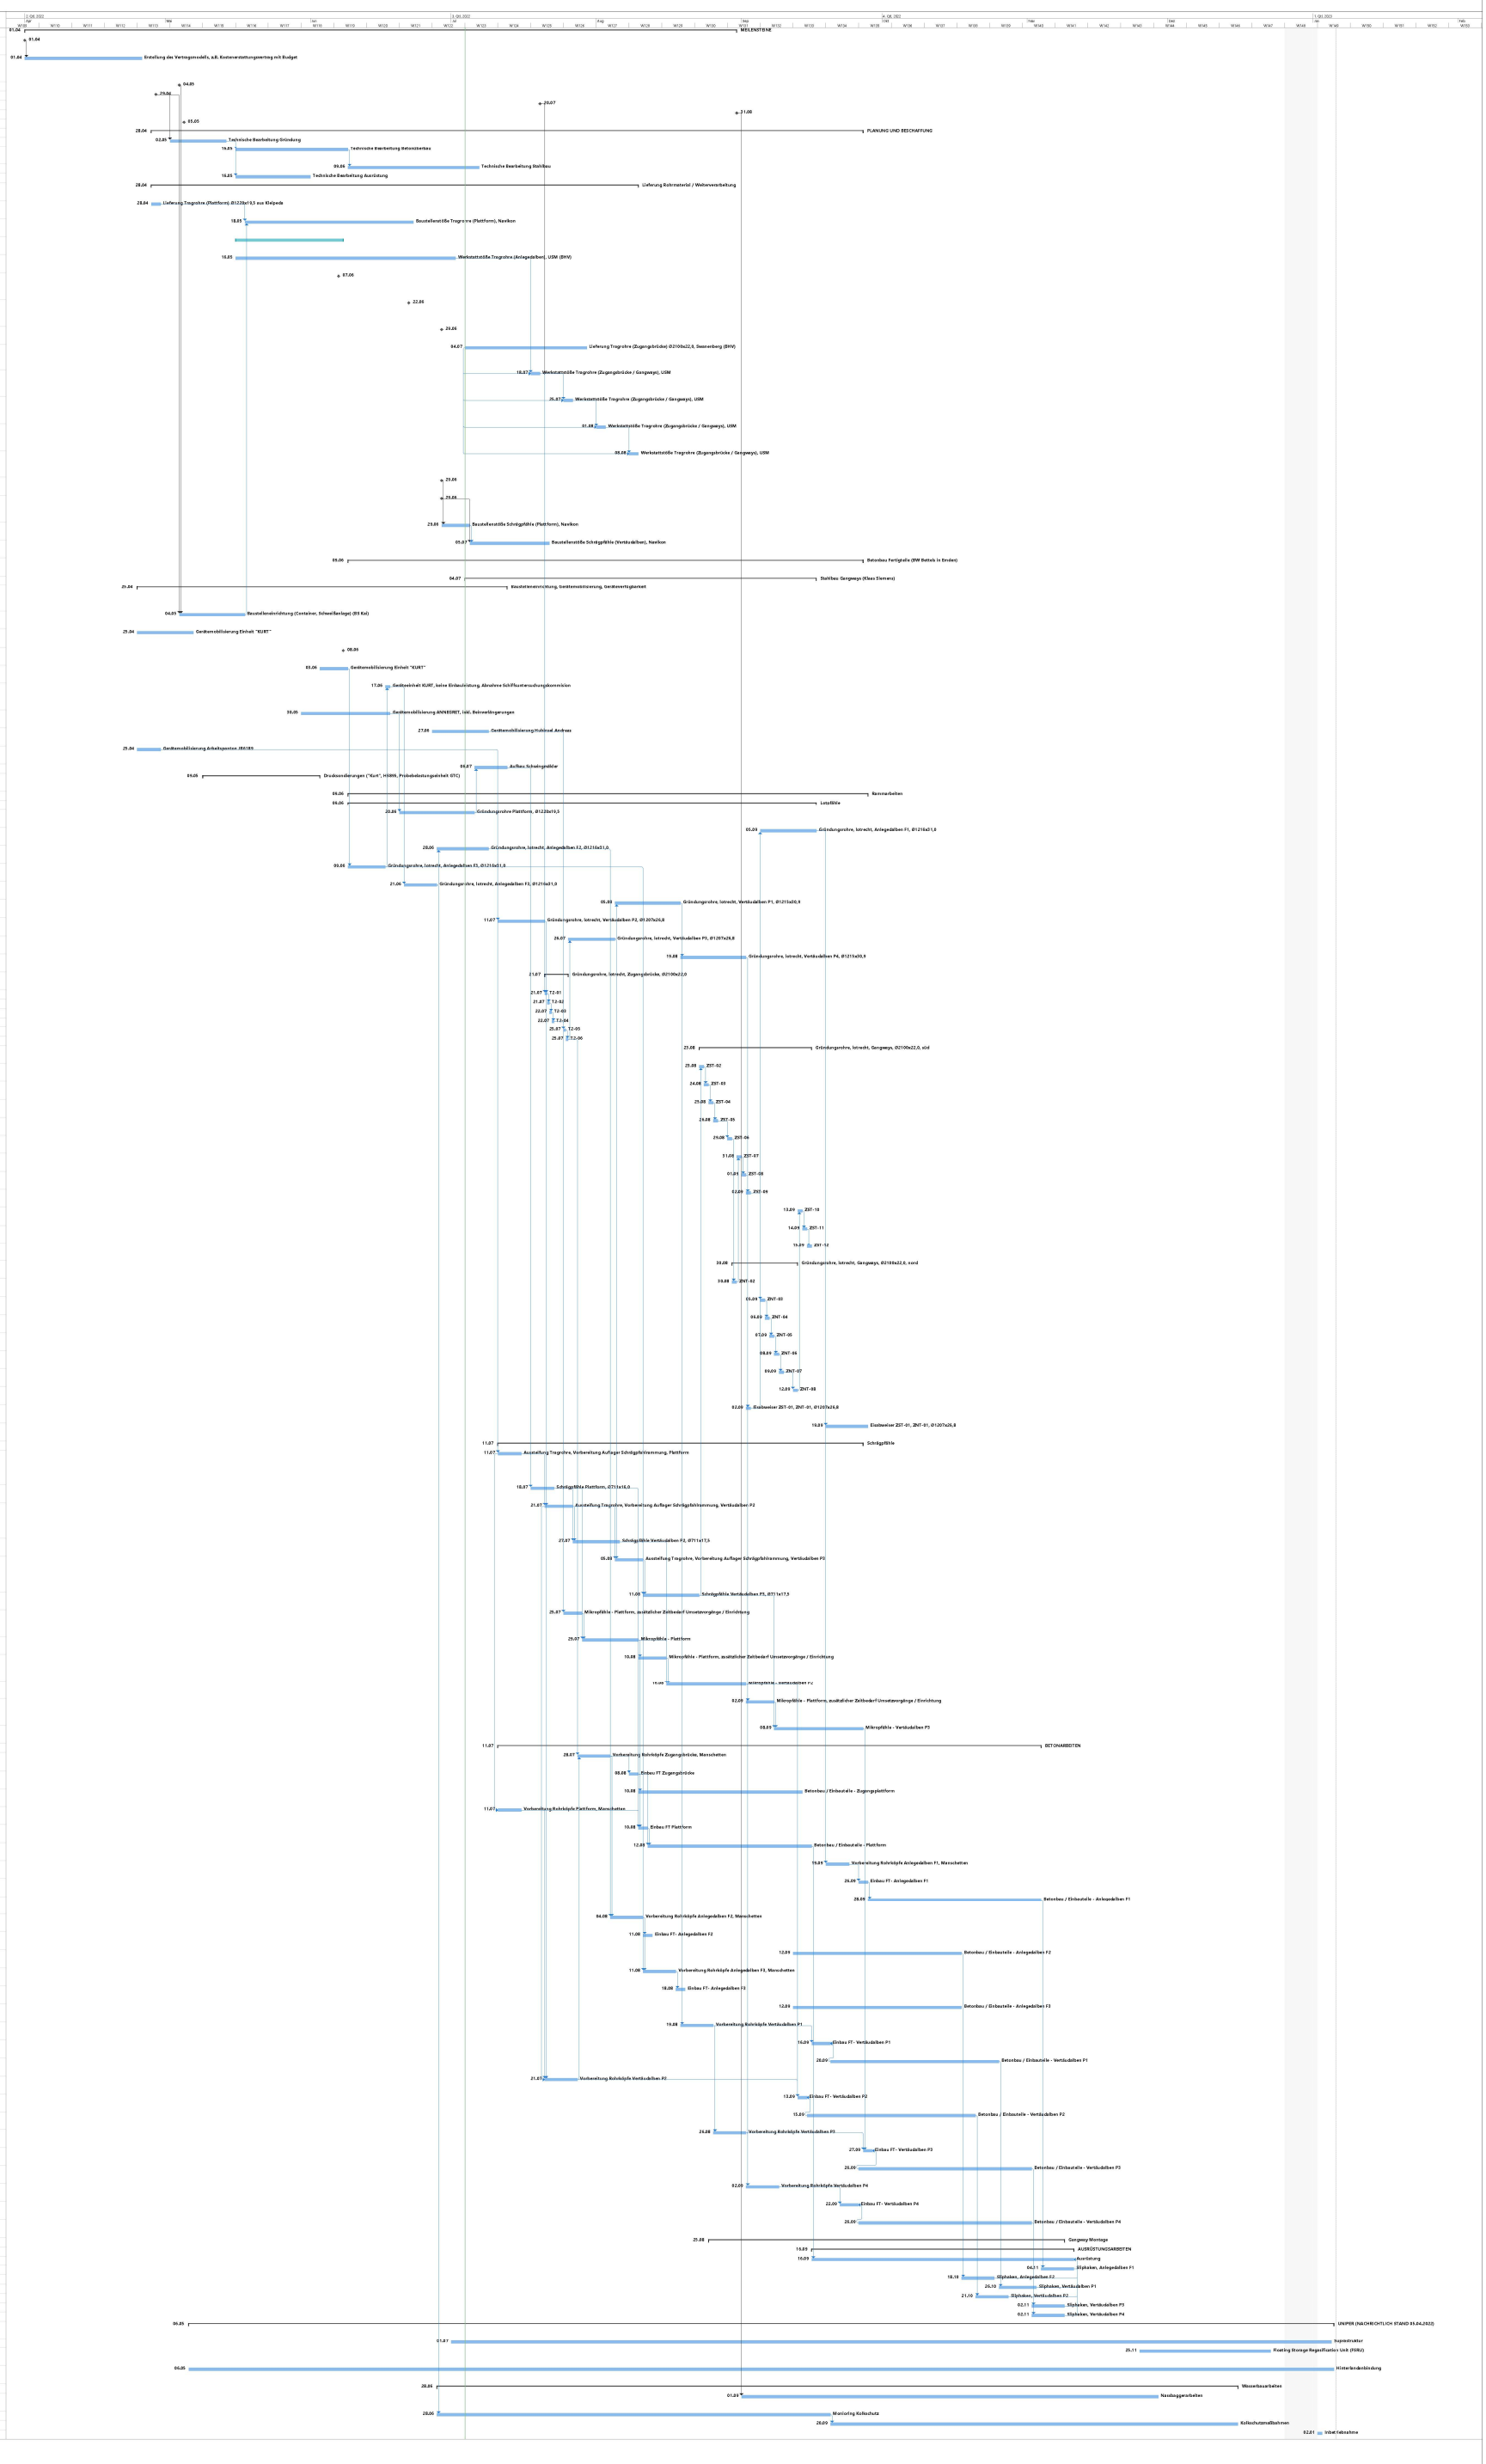

Projekt: Herstellung Infrastruktur
Datum: Mon 04.07.22

Vorgang | Listenbreichung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorg | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externe Meilenstein | Fortschritt | In Arbeit | Manueller Fortschritt
